



# Fasi costruttive: galleria e trincea

STATO ATTUALE

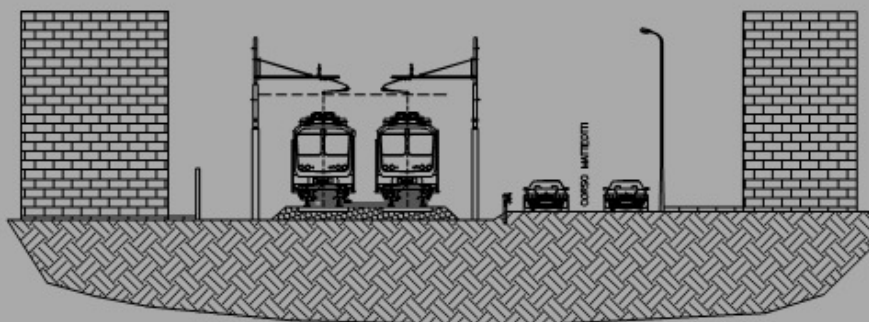


FASE 1

- CIRCOLAZIONE TRENI A SINGOLO BINARIO
- RESTRINGIMENTO CARREGGIATA STRADALE
- REALIZZAZIONE PALI DX
- REALIZZAZIONE PARZIALE SOLETTA COPERTURA
- REALIZZAZIONE DEVIATA PROVVISORIA

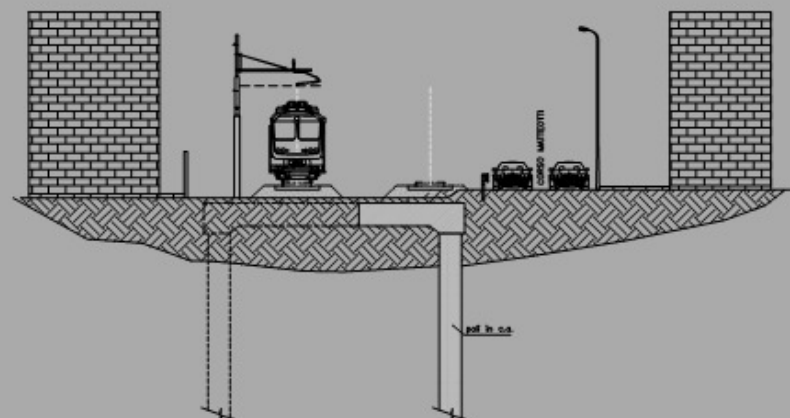

FASE 2

- CIRCOLAZIONE TRENI SULLA DEVIATA PROVVISORIA
- REALIZZAZIONE PALI SX
- COMPLETAMENTO SOLETTA COPERTURA

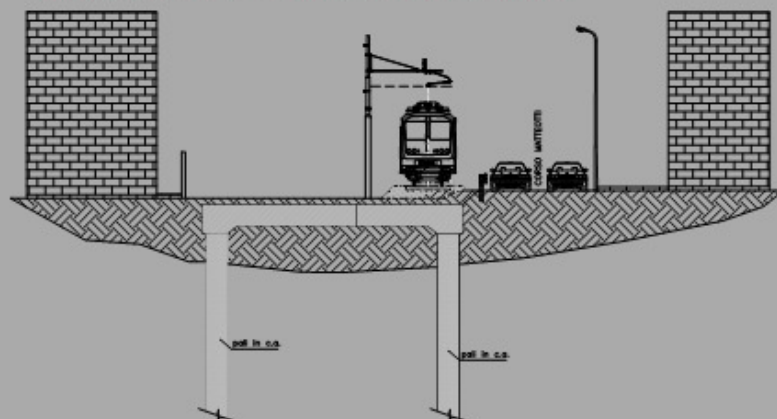

FASE 3

- SCAVO MILANO GALLERIA
- COMPLETAMENTO GALLERIA

